



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری خاک مازاد آبنندان کیاکلایه

لنگرود

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت ساحل نقش (سهامی خاص)

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۶/۲۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری خاک مازاد آبندان کیاکلایه لنگرود	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰	.

وضعیت مالی طرح


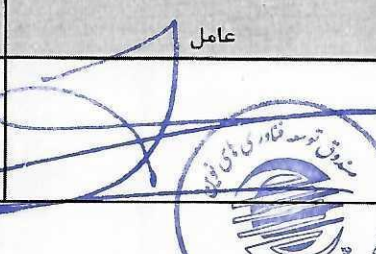

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۷,۶۸۳,۲۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۷۳,۶۸۳,۲۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۸۰,۸۲۵,۶۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۴۸,۸۲۵,۶۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش-بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵,۴٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰,۴٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ساختمانی ساحل نقش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

	<p>عامل</p> 	<p>نهاد مالی</p> 
---	---	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش فرآوری خاک مازاد آبیندان کیاکلایه لنگرود	۲۵	۵۰.۴	۵۰.۰

تعهد شرکت

- شرکت ساحل نقش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام

نهاد مالی	عامل	مشقذ
مشاور مالی آرئی فایتمک	شرکت توسعه تعاونی مالی نوین	شرکت ساحل نقش شماره ثبت: ۳۹۰۰
